
	®	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger
1	⊌	Projektstart	1 tag	01.11.17 08:00	01.11.17 17:00	
2	✓	Technologierecherche	5 tage	01.11.17 08:00	07.11.17 17:00	
3	✓	Hubot	5 tage	01.11.17 08:00	07.11.17 17:00	
4	₩	Botkit	5 tage	01.11.17 08:00	07.11.17 17:00	
5	₩	Aufbau Entwicklungsumgebung	3 tage	15.11.17 10:00	20.11.17 10:00	2
6	₩	Softwaredesign	10 tage	15.11.17 10:00	29.11.17 10:00	2EA+14 tage
7	₩	Schnittstellenbeschreibung	10 tage	15.11.17 10:00	29.11.17 10:00	
8	₩	Datenmodell	10 tage	15.11.17 10:00	29.11.17 10:00	
9		Abnahme Konzept	1 tag	04.01.18 08:00	04.01.18 17:00	6
1 0	Ö	Implementierung	65 tage	01.01.18 08:00	30.03.18 17:00	9
11	✓	Architektur (Docker, Nodeserver etc.)	5 tage	01.01.18 08:00	05.01.18 17:00	5
1 2	✓	Backend (=Terminkalender)	7 tage	08.01.18 08:00	16.01.18 17:00	11
1 3	✓	Frontend (=Bot-Schnittstelle)	7 tage	17.01.18 08:00	25.01.18 17:00	12
1 4	✓	Tests	5 tage	26.01.18 08:00	01.02.18 17:00	13
1 5		Abnahme Prototyp 1	1 tag	28.02.18 08:00	28.02.18 17:00	14EA+3 tage
1 6	✓	Implementierung der Änderungswünsche	2 tage	01.03.18 08:00	02.03.18 17:00	15
1 7	Ö	Abnahme Prototyp 2	1 tag	28.03.18 07:00	28.03.18 17:00	16EA+3 tage
1 8	O	Dokumentation	65 tage	01.01.18 08:00	30.03.18 17:00	1
1 9	Ö	Projektabschluss	5 tage	30.03.18 08:00	30.03.18 17:00	18EA+3 tage

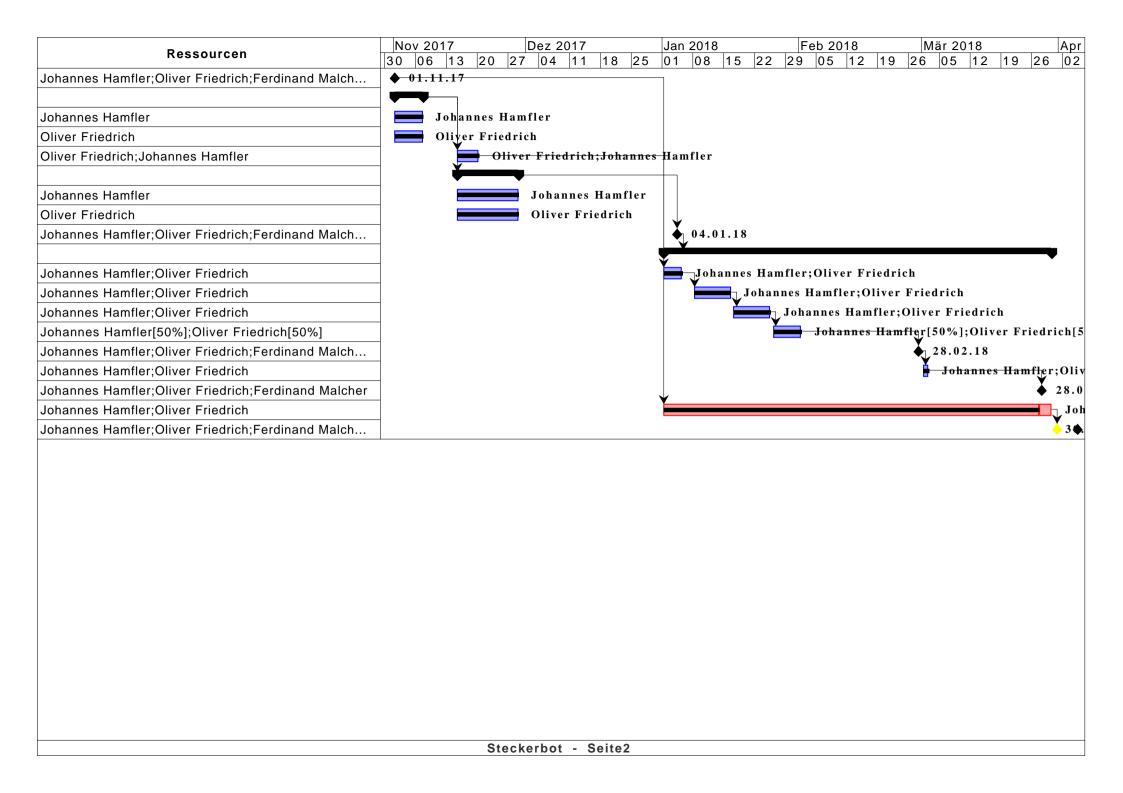

2018			
09	16	23	
0%]			
er Fri	edri	c h	
2 10			
3.18			
3.18 annes	Har	nflei	r : (
annes		nflei	r;(
		nflei	r;(
annes		mfleı	r;(
annes		mfleı	r;(
annes		mflei	r;(
annes		nflei	r;(
annes		nflei	r;(
annes		nfler	r;(
annes		nfler	r; (
annes		nfler	r; (
annes		nfle	r;(
annes		nfle	r;(
annes		nfler	r;(
annes		nfler	r;(
annes		nfler	r;(
annes			r;(
